

Сводный отчет о производственной деятельности

21.12.2015 - 27.12.2015

Показатели производственной деятельности

№ п/п	Показатели	ВСВ	КолЕВ
1	Добыто питьевой воды, м ³	464 431	201 950
2	Общий объем реализации питьевой воды, м ³	449 940	60 480
3	Перекачено стоков, м ³	-	1 472
4	Отказы оборудования	нет	нет
5	Аварийные ситуации	нет	нет


Перечень работ, выполненных за отчетную неделю

№ п/п	Филиал	Мероприятия
1	ВСВ	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ согласно утвержденных графиков ППР.2. Ведутся работы по ППР ЗРА в камерах от НС №1 до НС №2.3. Контроль выполнения работ по оценке технического состояния скважин.4. Контроль выполнения работ по выполнению исполнительной съемки магистрального водовода.5. Опробование в/в электродвигателя на НС-1.6. Монтаж артезианских насосов на участке "Покров".7. Ремонт ПЧ-ТТП на НС-1.8. Ремонт ВЧРП на НС-3.
2	КолЕВ	<ol style="list-style-type: none">1. Трассировка участка правой трубы у д. Вострянское до К-45 протяженностью 530 п.м"2. Трассировка участка трубы в р-не врезки Лопатинского рудника в сторону ж/д переезда и в сторону К-53 протяженностью 1,05 км.3. Осмотр и ревизия настольно-сверлильного станка с заменой клинового ремня.4. Осмотр и ревизия НА-4 с заменой сальников, протяжкой крепежа.5. Осмотр трассы коллектора от ГКНС до К-129.6. Профилактика электрооборудования в слесарной мастерской и на электроучастке. Проверка работы электродвигателя, защитного автомата, магнитных пускателей, подтягивание контактных групп.7. Монтаж кабеля для управления электрооборудованием решетки и прессы в грабельном отделе.8.Профилактический ремонт щита освещения в ТП-168. Проверка работы защитных устройств, подтягивание контактов.

ВСВ. Работы по ППР ЗРА в камерах от НС №1 до НС №2



ВСВ. Работы по оценке технического состояния скважин

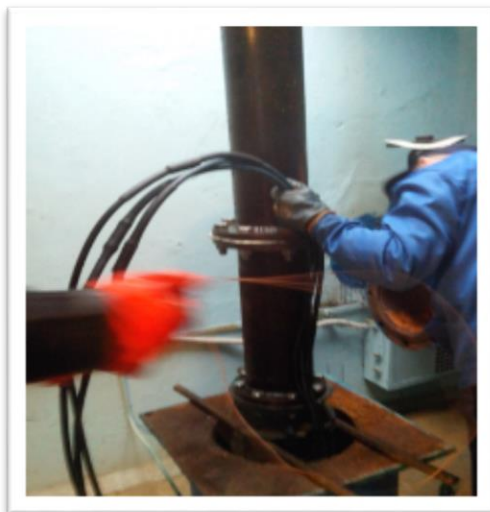

Колев. Трассировка участка правой трубы у д. Вострянское до К-45 протяженностью 530 п.м



Колев. Трассировка участка трубы в р-не врезки Лопатинского рудника в сторону ж/д переезда и в сторону К-53 протяженностью 1,05 км.



Колев. Осмотр и ревизия НА-4 с заменой сальников, протяжкой крепежа



Колев. Монтаж кабеля для управления электрооборудованием решетки и прессы в грабельном отделе

